

2025년 소극장 보노마루

상반기 무대점검 주요점검내용

주요점검사항		세부 점검내용	점검일자	점검인원	결과
무대기계	1) 상부 무대기계 동작 점검	동작 이상 유무 및 상태점검 기계실 메인 및 컨트롤 패널 점검	3/21	2명	완료
	2) 상부 그리드 점검	각 부위 체결 상태 점검	3/25-26	2명	완료
	3) 덧마루 및 객석의자 점검	덧마루 및 객석의자 점검	3/28	2명	완료
	4) 장치반입 리프트 점검	리프트 동작이상 유무 및 상태점검	3/17	2명	완료
무대조명	1) 조명시스템 점검	신호선 연결 상태 및 분배기 점검	3/12-13	2명	완료
	2) 전원부 회로점검 및 누전체크	전원부 회로점검 및 누전체크 디머 패널 점검	3/12	2명	완료
	3) 조명기기 및 객석등 점검	각 조명기기 점검 객석등 시스템 점검	3/12-13	2명	완료
	4) 케이블 점검	신호선, 전원선 등 점검	3/12-13	2명	완료
무대음향	1) 음향시스템 점검	앰프 점검 및 음향선로 점검	3/11-12	4명	완료
	2) 영상시스템 점검	영상선로 연결 상태 점검	3/18-19	2명	완료
	3) 음향 장비 점검	마이크, 스피커 등 점검	3/26-28	3명	완료
	4) 케이블 점검	신호선, 전원선 등 점검	3/20	2명	완료

상부 구동 및 채결 상태 확인




전동 바튼 디스크드럼 교체



내 용

1. 상부 무대기계 구동점검 및 채결 상태 확인
2. 디스크드럼 교체 및 그리드 점검
3. 객석 구조 점검
4. 텃마루 및 장치반입구 리프트 점검

무대조명 전원 및 신호선 점검

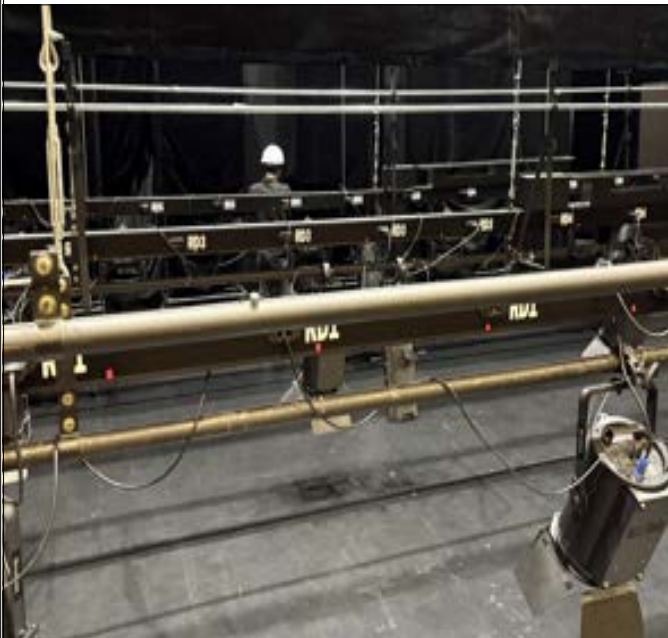


기계실 채결 상태 및 누전 체크



내 용

1. 조명시스템 점검
2. 전원부 회로점검 및 누전체크
3. 신호선 및 분배기 연결 상태 점검
4. 객석등 그리드 채결 상태 및 전원선 점검

음향콘솔 교체	음향시스템 점검
	
내 용	1. 음향시스템 점검 2. 음향콘솔 교체(모델명 M32) 3. 메인 스피커 튜닝
메인 스피커 점검	조명, 음향, 영상 선로 점검
	
내 용	1. 앰프 및 메인스피커 점검 2. 조명, 음향, 영상 선로 점검

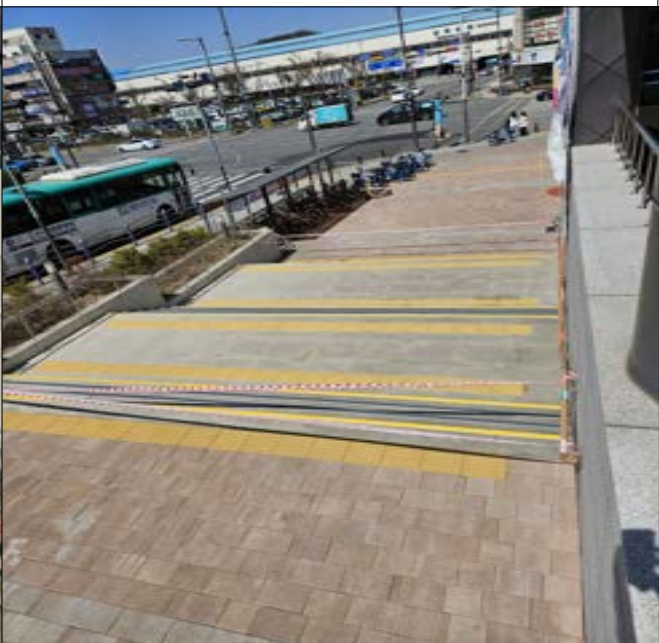무대바닥 도색 1차	무대바닥 도색 3차
	
내 용	1. 무대바닥 점검 및 보수 2. 무대바닥 도색 3차
경사로 재시공	야외계단 논슬립 설치
	
내 용	무대점검 기간 내 BF 인증 관련 추가 요청작업 마무리 후 자료 송부
